

## Kohtvaatluse protokoll

Asukoht: Rummu küla, Turbatootmisala


Kohtvaatluse teostajad: keskkonnaspetsialist Margus Kirss, abivallavanem Ranno Pool ja Ehitusspetsialist Enno Tammemäe

Kohtvaatlusel osalesid: Tootsi Turvas AS esindaja Evelin Krekker ja alltöövõtja Vändra MP esindaja Tiit Kangert.

Aeg: 13.30-14.15 17.10.2024

Teostatud kohtvaatlus teostati, et kontrollida, kas turbatootmisala juurdepääsutee on rajatud projekti kohaselt ning tuvastada tegevused turbatootmisalal


Kohtvaatlusel tuvastati järgmist:

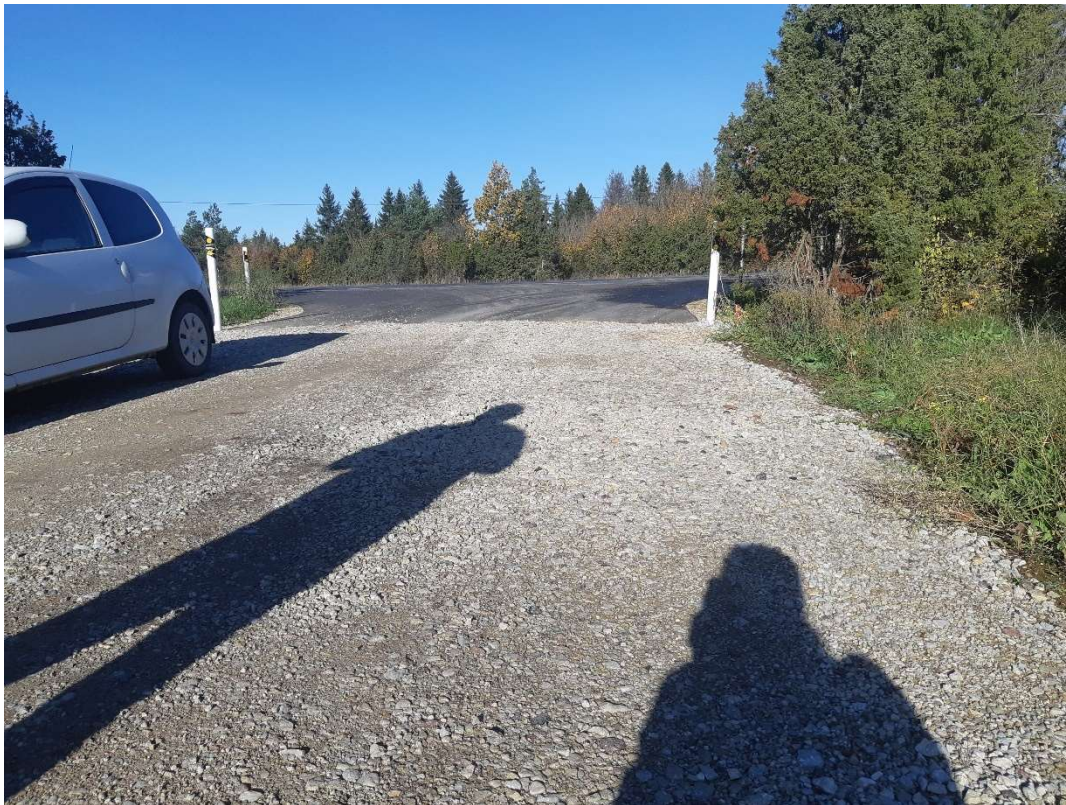

Pilt 1. Juurdepääsutee mahasõit.



Pilt 2. Tee osa Kaberla hoiualal.

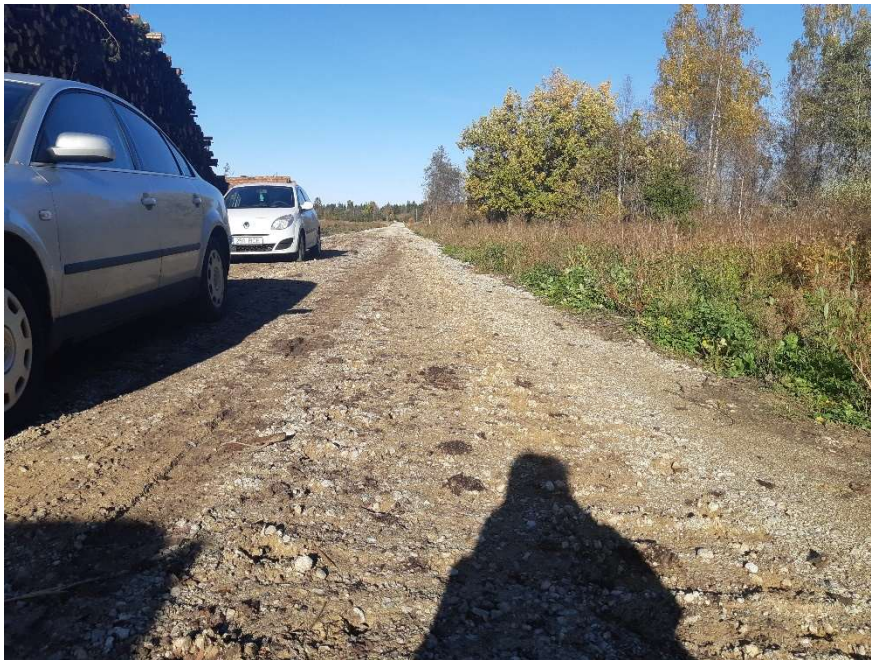

Pilt 3. Tee osa 3.



Pilt 4. Tee osa maardlani.

Kohtvaatlusel kontrolliti, kas maardla juurdepääsutee ehitus vastab ehitusprojektile. Vastavalt ehitusprojektile jaotati tee ehitus nelja osasse: asfaltkattega mahasõit, betoonkattega teeosa Kaberla hoiualal, teeosa killustikukattega ning geotekstiiliga teeosa, mis on kaetud killustikuga. Kohtvaatluse käigus selgus, et juurdepääs tee rajamine ei ole veel täielikult lõpuni viidud. Tee teine ja neljas osa vajavad veel täiendavaid töid. Visuaalsel hinnangul tundus, et tee ehitus oli teostatud vastavalt projektile.

Tiit Kangert kinnitas, et tööd on tehtud vastavalt ehitusprojektile. Pinnast ei ole suuremal määral eemaldatud kui ehitusprojekt võimaldas. Osaliselt on tööd veel pooleli, sest kaevandusala pole aktiivses kasutuses.

Margus Kirss küsis ka tee rajamisel välja kaevatud materjali kohta. Varasemalt on valla poole pöördunud lubjakivi materjali leidumisega eemaldatud materjali hulgas. Tiit Kangert selgitas, et juurdepääsutee ees oli kivist piirdeaed. Kiviaed jäi ette tee rajamiseks ning selle tõttu oli see vaja eemaldada. Kinnistu omanik andis loa aia likvideerimiseks. Kiviaiast pärinev lubjakivi hoiustati muu eemaldatud pinnase peal, sest seda oli plaanis kasutada tee täitematerjalina. Praeguseks ajaks on kiviaiast pärinevat lubjakivi kasutatud tee tagasitäiteks.

Kokkuvõtvalt saab väita, et juurdepääsutee ehitamine on praeguse etapini teostatud vastavalt väljastatud ehitusloale ja ehitusprojektile.



Pilt 5. Turbatootmisala raadatud ala.



Pilt 6. Teine pilt raadatud alast.

Kohtvaatluse käigus käis Margus Kirss koos Evelin Krekkeri ja Tiit Kangertiga turbatootmisalal teostatud töödega tutvumas. Anti teada, et peamiselt on tegeletud turbatootmisala raadamistöödega, mille jaoks on loa andnud RMK. Raadamistööd on vajalikud, et tagada parem ligipääs turbatootmisalale ning ilma raadamata ei ole võimalik

teostada georadari uuringuid. Lisaks alustatakse Tiitsu kraavi ettevalmistustöödega, mille jaoks on koostatud projekt ning eksperdi arvamus, mille kohaselt ei ole vajalik kraavi puhastada. Eksperdi arvamuse kohaselt on vajalik jälgida ja vajadusel eemaldada kopratamme.

Tootmisala valmistatakse ette georadari esimese etapiga määratud kraavitust. Need on peamiselt piirdekraavid, mis rajatakse turbatootmisala piirialale. Paralleelselt esimese etapi kraavituse rajamisega hakatakse tegelema ülejäänud turbatootmisala raadamisega, et oleks võimalik viia läbi georadari 2. etapi uuring. Uuring on vajalik läbi viia, et välja selgitada moreenpinnase täpsem paiknemine. Kaevandusloaga sätestatus on välja toodud, et moreenist ei tohi läbi kaevata ning selle tõttu on vajalik moreenpinnase täpse asukoha väljaselgitamine georadari uuringuga.

Ettevalmistustööde teostamine võtab mitmeid aastaid. Evelin Krekker sõnul on võimalik turba tootmisega alustada umbes viie või kuue aasta pärast. Selle ajani teostatakse ettevalmistustöid.

Paikvaatluse protokollija:

(allkirjastatud digitaalselt)

Margus Kirss

keskkonnaspetsialist
